


Ausbau der B 42 und Neubau eines Radweges in der OD Osterspai Retentionsraum

Tabelle Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation Retentionsraum

Deckblatt zum Feststellungsentwurf

Stand: 15.11.2022

Maßnahmen-Nr. A.14-02-0112

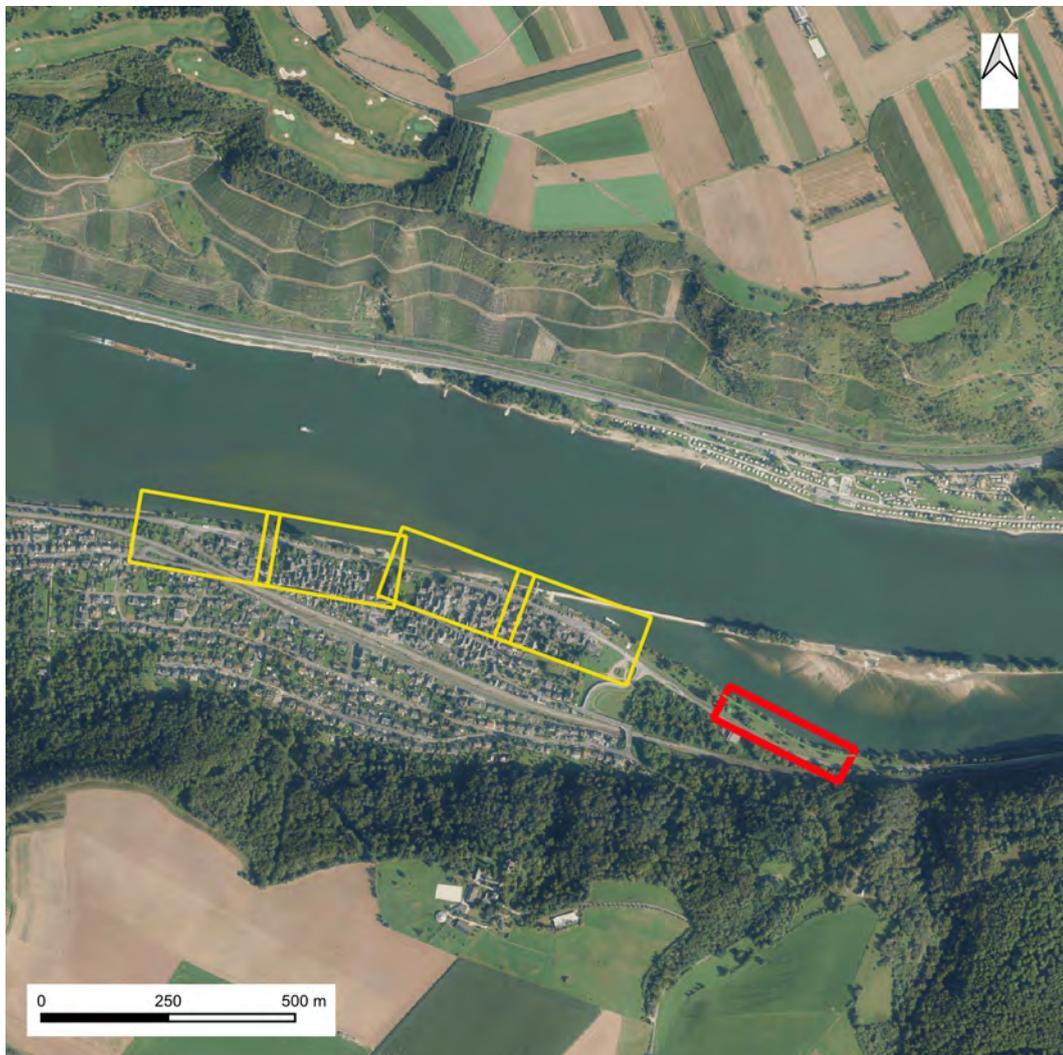

Bearbeitet von:

FLP WITT
Büro für Freiraum- und Landschaftsplanung

Karlheinz Witt
Dipl.-Ing. Landespflege
Bartelstraße 3 – 65558 Lohrheim
T. 06430.91023 – F. 06430.91043
eMail post@FLP-WITT.de - www.FLP-WITT.de

Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation

Ausbau der B 42 und Neubau eines Radweges in der OD Osterspai			LBM Diez
Maßgebliche Konflikte (B: Biotop-/ Biotopverbund-/ Habitatfunktion, Bo: natürliche Bodenfunktionen, Gw: Grundwasserschutzfunktion, Ow: Regulationsfunktion im Landschaftswasserhaushalt, K: klimatische/ lufthygienische Ausgleichsfunktion (bei Siedlungsfunktion), L: Landschaftsbildfunktion/ landschaftsgebundene Erholungsfunktion)	Dimension, Umfang	Zugeordnete Maßnahmenkomplexe/ Einzelmaßnahmen (V: Vermeidungsmaßnahme, A: Ausgleichsmaßnahme, E: Ersatzmaßnahme)	Dimension, Umfang
<i>Gefahr möglicher Verletzung von Verbotstatbeständen des § 44 (1) und (5) BNatSchG</i>	-	1 V Rodung von Gehölze und Baufelddräumung nur zwischen dem 01.10. und Ende Februar	-
	-	2 V Überprüfung der zu rodenden Bäume auf Fledermausbesatz unmittelbar vor der Rodung	7 St.
<i>Gefahr der Beeinträchtigung von Biotopen und Habitaten durch den Baubetrieb</i>	-	3 V Ausweisung von naturschutzfachlichen Ausschlussflächen, Markierung der Bereiche zur Baustelle hin	250 m
	-	4 V Schutzmaßnahme an Bäumen in der Nähe des Baufeldes nach RAS-LP4 und der DIN 18.920	3 St.

Zusätzliche Maßnahmen für die Herstellung des Retentionsraumes			
B/ Bo Bodenabtrag: temporärer Verlust (potenzieller) Biotopstandorte, temporäre Änderung der natürlichen Bodenfunktionen	2.900 m ²	7 A Erhalt der Bodenfunktionen und der vorhandenen Bodenlebewesen und Habitatstrukturen durch Wiedereinbau der abgeschälten oberen Bodenschicht	2.900 m ²
B/ L Verlust von Laubbäumen: Verlust von Habitaten, Verlust gliedernder und belebender Elemente	7 St.	8 A Laubbaumpflanzung: Hochstämme	16 St.

Aufgestellt:

Lohrheim, 15.11.2022

