Ersatzneubau der Moselbrücke Schweich i.Z.d. L 141 - Planfeststellungsentwurf

3. BAUABLAUF

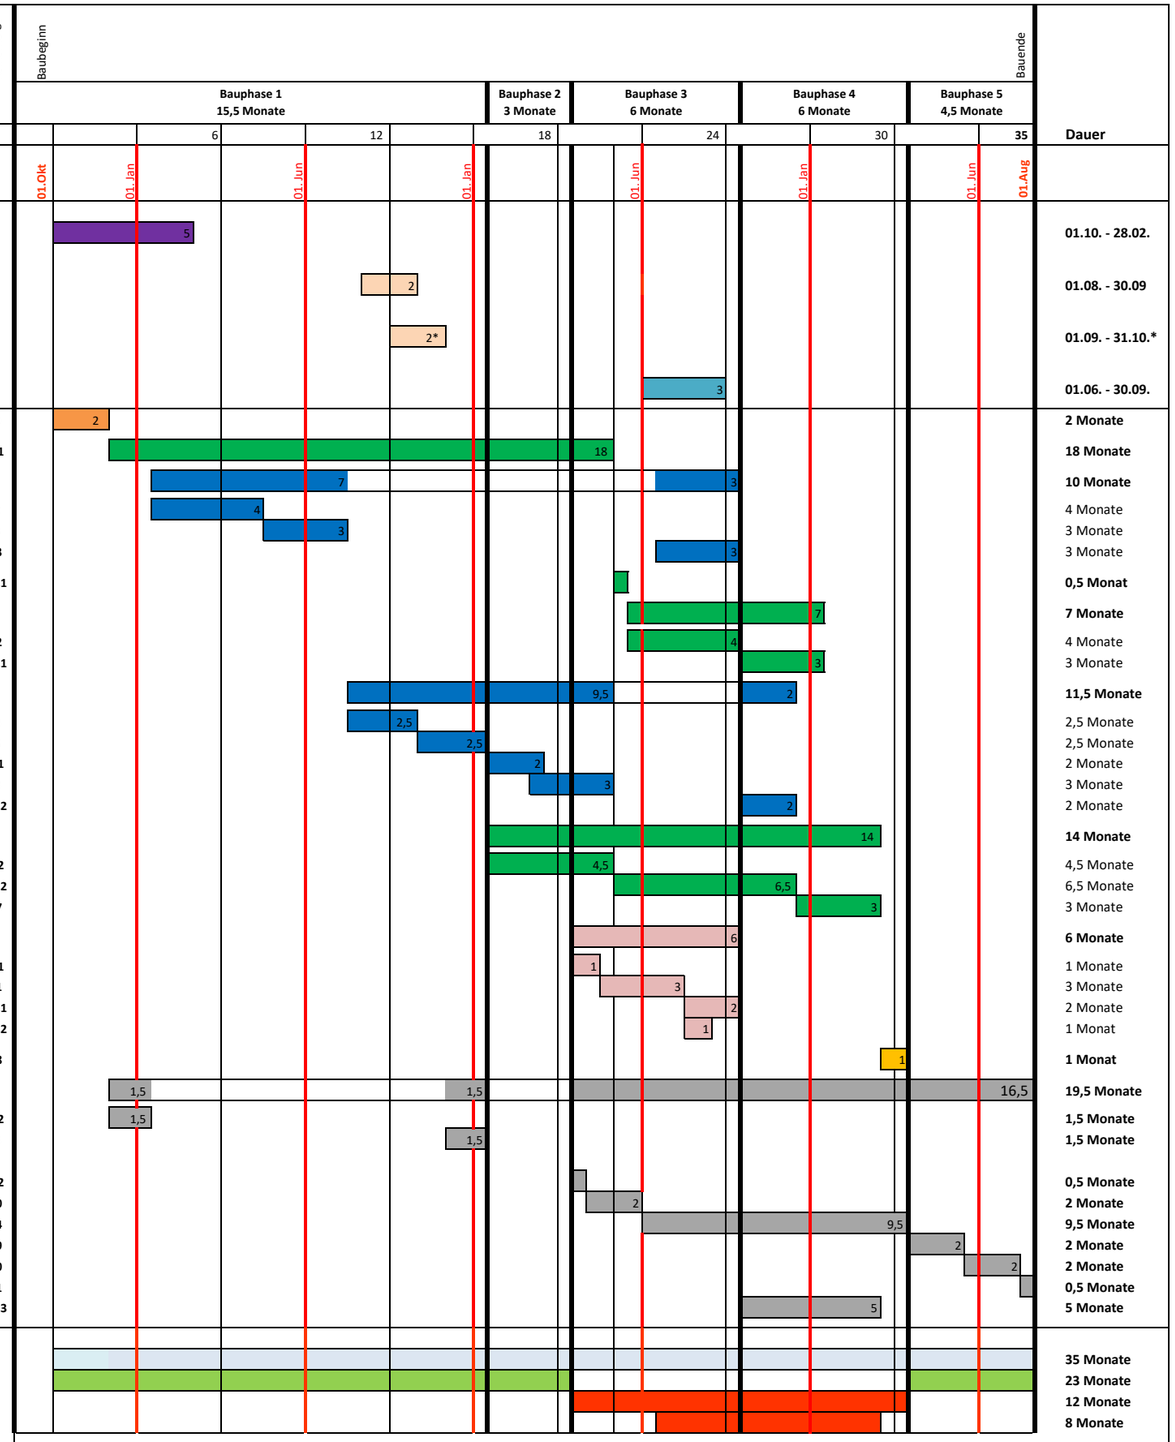

	Reihenfolge	Dauer
Vorgaben Landespflege		
A. Baufeldräumung Gehölze/Bäume Schutzzäune / Baumschutz		**01.10. - 28.02.**
B. morgl. Detektorbegehung & Verschluss am alten Brückenwiderlager		**01.08. - 30.09**
C. Kontrolle mit Brückenuntersichtsgerät und Verschluss der Öffnungen*		**01.09. - 31.10.***
D. Wiederherstellung Montagefläche		**01.06. - 30.09.**
0. Vorarbeiten / Baustelleneinrichtung	**0**	**2 Monate**
I. Vormontage Stahlüberbau Teil-BW A	**1.1**	**18 Monate**
II. Unterbauten Teil-BW A		**10 Monate**
Widerlager Achse 0	**2**	4 Monate
Pfeiler Achse 1	**3**	3 Monate
Stützwand I	**13**	3 Monate
III. Einschwimmen des Stahlüberbaus	**12.1**	**0,5 Monat**
IV. Betonüberbau Teil-BW A		**7 Monate**
Fahrbahntafel	**12**	4 Monate
Abdichtung und Kappen	**16.1**	3 Monate
V. Unterbauten Teil-BW B		**11,5 Monate**
Pfeiler Achse 2	**4**	2,5 Monate
Pfeiler Achse 3	**5**	2,5 Monate
Pfeiler Achse 4	**7.1**	2 Monate
Widerlager Achse 50	**8**	3 Monate
Stützwand II	**16.2**	2 Monate
VI: Betonüberbau Teil-BW B		**14 Monate**
Feld 1 und 2	**7.2**	4,5 Monate
Feld 3 und 4	**12.2**	6,5 Monate
Abdichtung und Kappen	**17**	3 Monate
VII. Abbrucharbeiten		**6 Monate**
Vorarbeiten	**9.1**	1 Monate
Teil BW B	**11**	3 Monate
Teil BW C	**15.1**	2 Monate
Teil BW A	**15.2**	1 Monat
VIII. Asphalt- und Anpassungarbeiten	**18**	**1 Monat**
IX. Straßenbauarbeiten		**19,5 Monate**
Radweg Seite Longuich	**1.2**	**1,5 Monate**
Linksabbieger "Kreusch"	**6**	**1,5 Monate**
KVP Schweich		
Bauphase I	**9.2**	**0,5 Monate**
Bauphase II	**10**	**2 Monate**
Bauphase III	**14**	**9,5 Monate**
Bauphase IV	**19**	**2 Monate**
Bauphase V	**20**	**2 Monate**
Bauphase VI	**21**	**0,5 Monate**
KVP Longuich	**16.3**	**5 Monate**
Gesamtbauzeit		**35 Monate**
		23 Monate
Vollsperrung Moselquerung		**12 Monate**
Sperrung L 145 Longuich-Kenn		**8 Monate**

Ohne Berücksichtigung von Schlechtwetterphasen, Hochwasserperioden hierdurch wird sich die Bauzeit i.d.R. nochmals verlängern!
*** Sollte möglichst 1 Jahr vor dem Brückenabriss in dem Zeitraum 01.09. bis 31.10. erfolgen.**
